

# SRJMK 2021+

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+

**Vyhodnocení naplňování  
Akčního plánu SRJMK 2021+  
za rok 2022**

jihomoravský kraj

## ÚVOD

**Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+** (dále jen „SRJMK“) je koncepčním dokumentem, který do roku 2030 definuje specifické cíle a tematická opatření, jejichž prostřednictvím má dojít k udržitelnému rozvoji Jihomoravského kraje. Aby byla SRJMK živým dokumentem, musí být jeho realizace pravidelně vyhodnocována. Pro tyto účely se vytvořil tzv. **Akční plán** (dále jen „AP“), dříve také zvaný jako Program rozvoje Jihomoravského kraje, který je základním prvkem řízení a naplňování SRJMK a je tvořen vždy na dvouleté období. SRJMK společně s AP byly schváleny na 12. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaném dne 28. 4. 2022 usnesením č. 1060/22/Z12.

AP SRJMK na roky 2022–2023 vznikl tzv. principem top-down způsobem **rozpracování strategické části do úrovně jednotlivých aktivit a projektů**. Na zpracování AP se podílely jednotlivé odbory Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen „KrÚ JMK“) a organizace Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (ta však ukončila činnost v roce 2022), CCR JM a JIC, které průběžně od srpna 2021 doplňovaly a aktualizovaly jednotlivé aktivity na základě skutečného stavu. Na základě zaslaných seznamů projektů dotčenými subjekty bylo zjištěno, že z celkového počtu 130 tematických opatření by se měla realizovat alespoň jedna aktivita ve 114 z nich.

Graf 1 Počet projektů v AP SRJMK pro roky 2022–2023 v jednotlivých prioritních osách




Hodnocení probíhalo v období od ledna do března 2023 prostřednictvím sběru informací od výše uvedených subjektů a následnou revizí informací a sepsáním hodnotící zprávy. Samotný dokument nese název Vyhodnocení naplňování AP SRJMK za rok 2022 (dále jen „Vyhodnocení“) a bylo zpracováno s důrazem na kvalitativní zhodnocení dílčích aktivit.

## Vyhodnocení plnění aktivit AP SRJMK v roce 2022

Plnění aktivit bylo vyhodnoceno na základě sběru informací od jednotlivých odborů KrÚ JMK a dalších dotčených subjektů, které zhodnotily způsob plnění buď kvantitativním (profinancované náklady, plnění kvantitativních indikátorů), nebo kvalitativním způsobem (slovní hodnocení plnění aktivity a stručné komentáře). Odbory a dotčené subjekty hodnotily jednotlivé projekty na základě čtyř kategorií hodnocení:

- **Splněno:** Projekt/aktivita byl splněn již v roce 2022 a v roce 2023 se nebude dále realizovat, v následujících letech se tedy bude vykazovat jako Splněno.
- **Částečně splněno/plněno průběžně:** Část projektu/aktivity byla realizována nebo dokončena již v roce 2022 a v následujících letech bude probíhat další realizace.
- **Bude plněno v dalších letech:** V roce 2022 se v rámci projektu/aktivity neplnila žádná aktivita, její plnění započne v následujících letech.
- **Neplněno/projekt zrušen:** Realizace projektu/aktivity byla zrušena.
- **Nezjištěno:** Tato kategorie byla přidána dodatečně k těm aktivitám, u kterých jejich garant neuvedl žádné informace.


Graf 2: Plnění aktivit v roce 2022 (počet aktivit = 418)

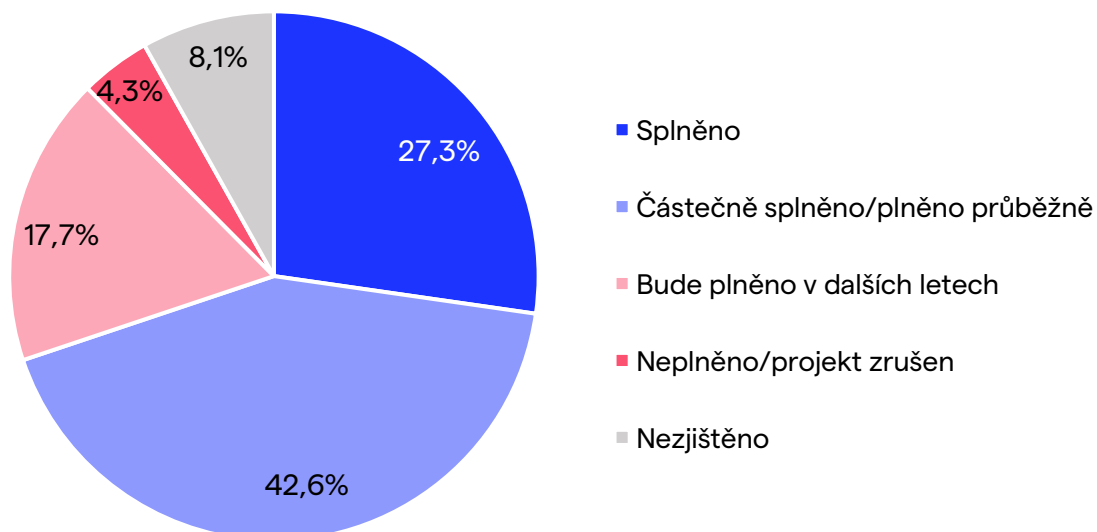

Více než jedna čtvrtina aktivit, celkem 114, bylo splněno již v průběhu roku 2022. Většina aktivit (178) pak byla splněna alespoň částečně nebo je plněna průběžně. Jednalo se převážně o aktivity, které se opakují každoročně, příkladem mohou být dotační programy, realizace seminářů a obdobných osvětových akcí nebo víceleté projekty. U 74 aktivit bylo uvedeno, že jejich realizace bude započata v budoucnu. Realizace celkem osmnácti aktivit pak byla zrušena, převážně z důvodů zrušení instituce, která aktivitu realizuje, nezařazení projektů mezi možné žadatele o dotaci z IROP, dokončení etapy projektu a nenavázání na další ad. 34 aktivit pak zůstalo bez hodnocení, nejvíce z nich se řadilo pod záštitu organizace JIC, která bude vyhodnocení plnění aktivit vypracovávat k červnu tohoto roku.

Přehled vyhodnocení dílčích aktivit nabízí Graf 3 níže, podrobnější popis plnění v jednotlivých prioritních osách je pak zpracován v následujících kapitolách.


Graf 3: Plnění aktivit v jednotlivých prioritních osách v roce 2022

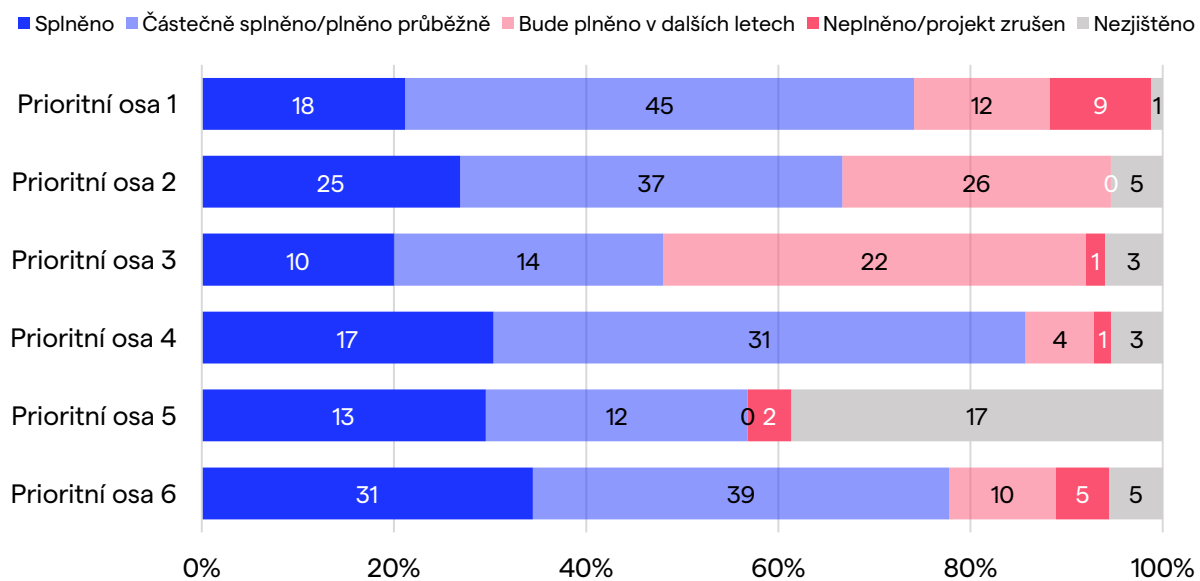

## Plnění prioritní osy 1: Vzdělávání, sport a mimoškolní zájmové aktivity

Prioritní osa 1 obsahuje celkem 85 aktivit, z nichž 18 bylo splněno v uplynulém roce. Více než polovina z těchto aktivit pak byla plněna částečně nebo se jednalo o aktivity s víceletým plněním, které započaly v loňském roce a budou pokračovat do těch dalších. Celkem dvanáct projektů pak bude plněno až v následujícím období, devět aktivit pak byla zrušeno. V tomto případě šlo o projekty, u nichž se plánovalo podání žádosti o dotaci z IROP, ovšem v průběhu roku 2022 došlo ke snížení finanční alokace na projekty v oblasti středních a speciálních škol, proto akce nebyly zařazeny do realizace.

Graf 4 Hodnocení plnění aktivit v prioritní ose 1: Vzdělávání, sport a mimoškolní zájmové aktivity

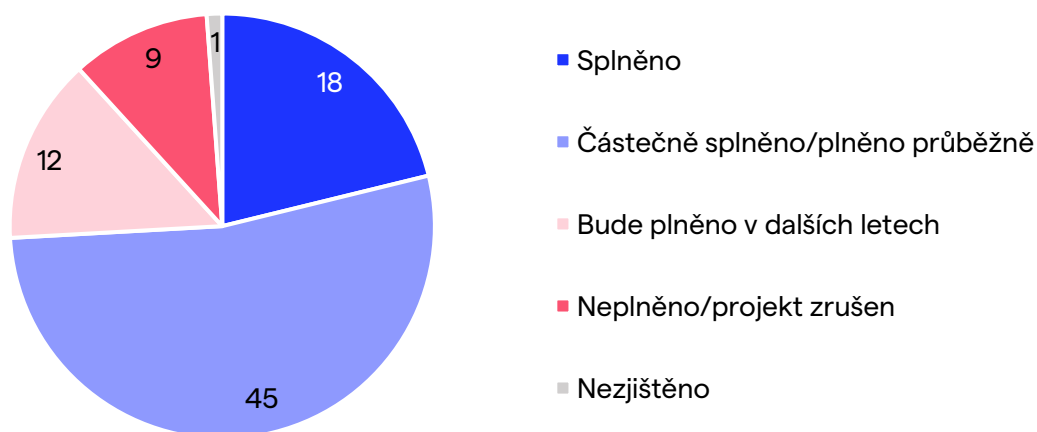

Tabulka 1 Hodnocení plnění aktivit v jednotlivých specifických cílech v prioritní ose 1: Vzdělávání, sport a mimoškolní zájmové aktivity


Specifický cíl	Splněno	Částečně splněno/ plněno průběžně	Bude plněno v dalších letech	Neplněno nebo projekt zrušen	Nezjištěno
1.1 Podpora maximalizace potenciálu každého obyvatele	1	18	2	2	0
1.2 Rozvoj vzdělávání překonávající bariéry a nerovnosti	8	4	0	1	0
1.3 Zajištění dostatečných personálních kapacit a rozvoj kvalifikace pedagogického personálu	0	2	1	0	0
1.4 Odpovídající stav vzdělávací infrastruktury	0	20	9	6	1
1.5 Zvýšení zájmu o pohyb a sport	6	0	0	0	0
1.6 Dostatečná kvalita a kapacita sportovní infrastruktury	3	0	0	0	0
1.7 Podpora mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže	0	1	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>18</b>	<b>45</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>1</b>

## Plnění prioritní osy 2: Zdravotnictví a sociální oblast

Prioritní osa 2 obsahuje celkem 93 aktivit, z nichž 25 bylo splněno v uplynulém roce. Jednalo se převážně o aktivity v rámci projektů s přeshraničními partnery nebo také investiční akce do sociálních služeb.

40 % ze všech aktivit této priority osy pak bylo plněno částečně nebo se jednalo o aktivity s víceletým plněním, které započaly v loňském roce a budou pokračovat do těch dalších. Celkem 26 projektů pak bude plněno až v následujícím období. U pěti projektů nebyl zjištěn způsob plnění aktivity.

Graf 5 Hodnocení plnění aktivit v prioritní ose 2: Zdravotnictví a sociální oblast

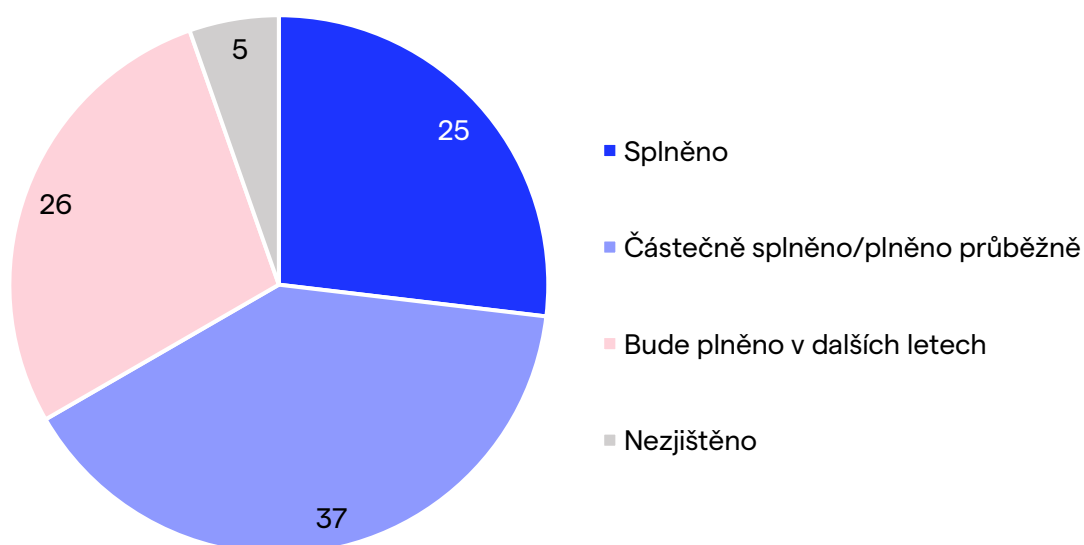


Tabulka 2 Hodnocení plnění aktivit v jednotlivých specifických cílech v prioritní ose 2: Zdravotnictví a sociální oblast

Specifický cíl	Splněno	Částečně splněno/ plněno průběžně	Bude plněno v dalších letech	Nezjištěno
2.1 Vytvoření systému udržitelného zdravotnictví	11	30	14	0
2.2 Dostupné sociální služby	3	4	10	4
2.3 Realizace podmínek pro důstojné stárnutí	4	0	1	0
2.4 Soudržná společnost bez sociálního vyloučení	7	3	1	1
<b>Celkem</b>	<b>25</b>	<b>37</b>	<b>26</b>	<b>5</b>

### Plnění prioritní osy 3: Dopravní infrastruktura a obslužnost území

Prioritní osa 3 obsahuje celkem 50 aktivit, z nichž 10 bylo splněno v uplynulém roce. Celkem 14 z těchto aktivit pak bylo plněno částečně nebo se jednalo o aktivity s víceletým plněním, které započaly v loňském roce a budou pokračovat do těch dalších. Nejvíce projektů, celkem 22, tj. 44 % z celkového počtu, pak bude plněno až v následujícím období s ohledem na stavební přípravu a zajištění zdrojového financování. Jedná se o investiční projekty buď s financováním z IROP, u nichž v roce 2022 probíhala příprava stavby a jejich realizace započne v následujícím období, anebo o projekty výstavby cyklostezek, u nichž prozatím probíhaly přípravné práce v rámci stavebního řízení. Jeden projekt byl pak nebyl plněn nebo byl zrušen.

Graf 6 Hodnocení plnění aktivit v prioritní ose 3: Dopravní infrastruktura a obslužnost území

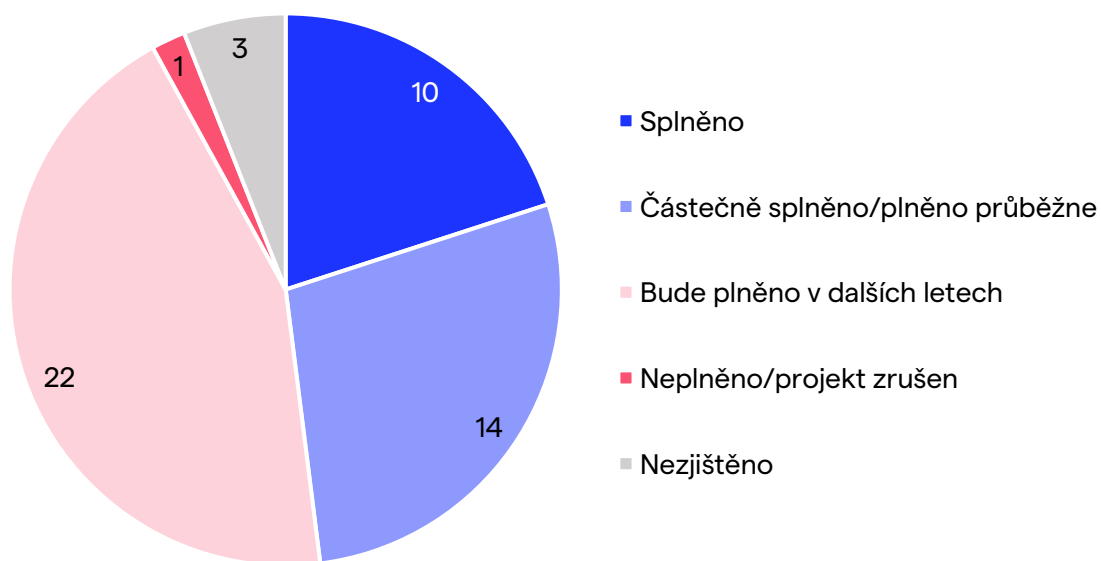


Tabulka 3 Hodnocení plnění aktivit v jednotlivých specifických cílech v prioritní ose 3: Dopravní infrastruktura a obslužnost území

Specifický cíl	Splněno	Částečně splněno/ plněno průběžně	Bude plněno v dalších letech	Neplněno nebo projekt zrušen	Nezcizštěno
3.1 Kvalitní dopravní síť kraje	9	10	22	0	0
3.2 Zvýšení obslužnosti území a efektivní integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje	1	4	0	0	2
3.3 Snížení uhlíkové stopy dopravního sektoru kraje	0	0	0	1	1
<b>Celkem</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

## Plnění prioritní osy 4: Životní prostředí, technická infrastruktura, rozvoj venkova a zemědělství

Prioritní osa 4 obsahuje celkem 50 aktivit, z nichž 17 bylo splněno v uplynulém roce. Více než polovina z těchto aktivit, celkem 31, pak byla plněna částečně nebo se jednalo o aktivity s víceletým plněním, které započaly v loňském roce a budou pokračovat do těch dalších. V případě této prioritní osy šlo o víceleté projekty financované z evropských fondů, dotační programy v gescích odborů regionálního rozvoje a životního prostředí, nebo memoranda v gesci odboru kancelář hejtmána. Celkem čtyři projekty pak budou plněny v následujícím období, jedna aktivita byla zrušena.

Tabulka 4 Hodnocení plnění aktivit v prioritní ose 4: Životní prostředí, technická infrastruktura, rozvoj venkova a zemědělství

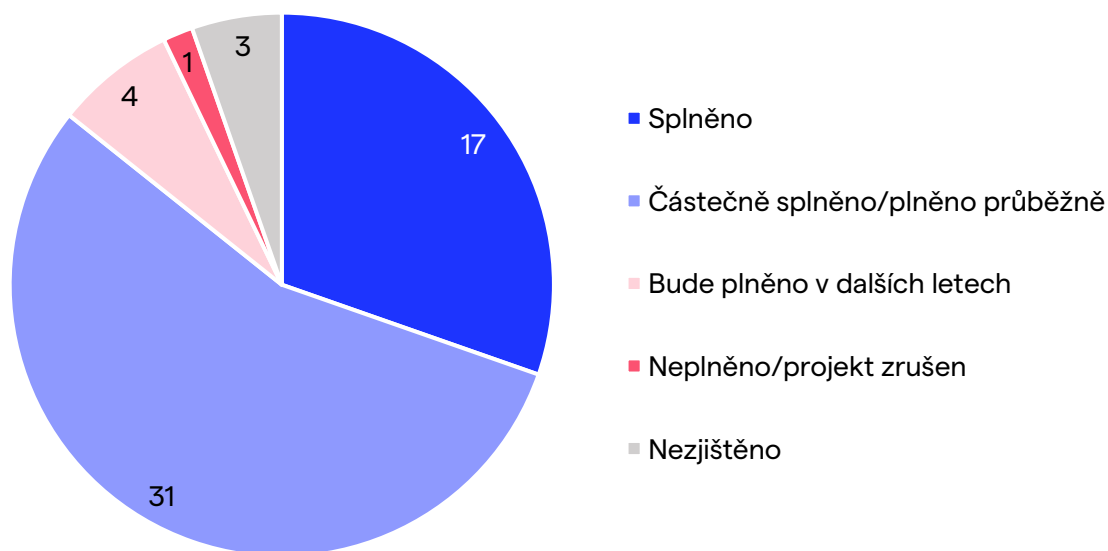

Tabulka 5 Hodnocení plnění aktivit v jednotlivých specifických cílech v prioritní ose 4: Životní prostředí, technická infrastruktura, rozvoj venkova a zemědělství


Specifický cíl	Splněno	Částečně splněno/ plněno průběžně	Bude plněno v dalších letech	Neplněno nebo projekt zrušen	Nezjištěno
4.1 Zvýšení stability ekosystémů a adaptace území na změnu klimatu	4	9	3	1	1
4.2 Zlepšení kvality ovzduší	2	4	0	0	1
4.3 Snižování dopadů lidské činnosti	2	4	0	0	0
4.4 Zachování a rozvoj kvality technické infrastruktury	3	4	0	0	1
4.5 Rozvoj občanské vybavenosti na venkově	1	8	0	0	0
4.6 Zlepšení způsobu obhospodařování půdy	5	2	1	0	0
<b>Celkový součet</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>



## Plnění prioritní osy 5: Konkurenceschopnost, podnikání, inovace a výzkum

Prioritní osa 5 obsahuje celkem 44 aktivit, z nichž 13 bylo splněno v uplynulém roce. U celkem 12 aktivit bylo uvedeno částečné nebo průběžné plnění. Dva projekty pak byly zrušeny. Největší podíl však tvoří projekty, u nichž nebylo zjištěno jejich plnění. Jednalo se o projekty v gesci organizace JIC, která bude plnění těchto aktivit hodnotit až na konci prvního pololetí roku 2023, tudíž u nich nebylo možné doplnit žádné informace.

Graf 7 Hodnocení plnění aktivit v prioritní ose 5: Konkurenceschopnost, podnikání, inovace a výzkum

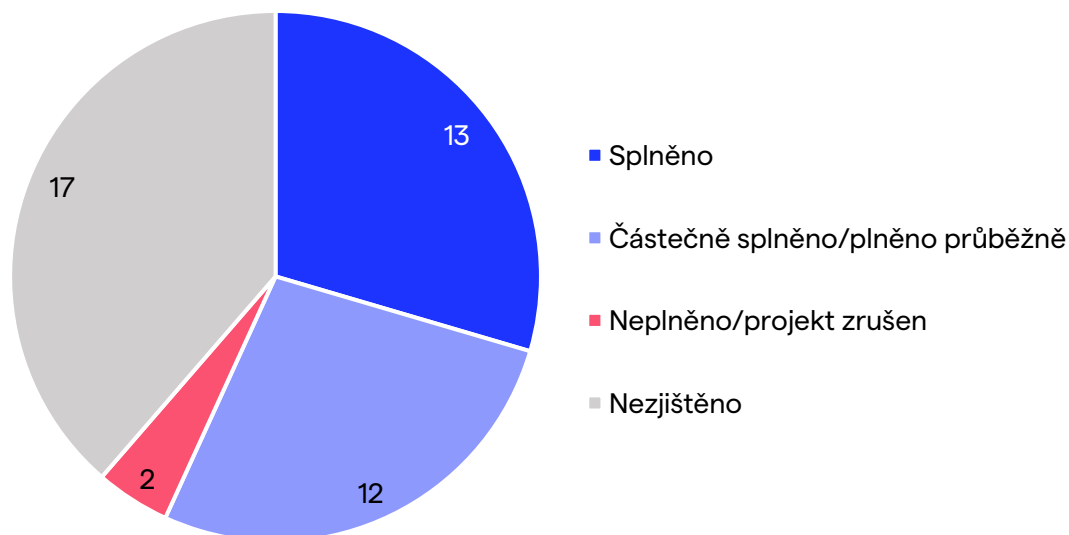


Tabulka 6 Hodnocení plnění aktivit v jednotlivých specifických cílech v prioritní ose 5: Konkurenceschopnost, podnikání, inovace a výzkum

Specifický cíl	Splněno	Částečně splněno/ plněno průběžně	Neplněno nebo projekt zrušen	Nezjištěno
5.1 Excelentní výzkum a odborné know-how	4	8	0	11
5.2 Úspěšné místní firmy a podnikatelé	6	4	2	6
5.3 Zakořeněné globální společnosti	3	0	0	0
<b>Celkový součet</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>17</b>

## Plnění prioritní osy 6: Cestovní ruch a kultura, veřejná správa, občanská vybavenost a bezpečnost

Prioritní osa 4 obsahuje celkem 90 aktivit, z nichž 31 bylo splněno v uplynulém roce. Nejvyšší počet aktivit, celkem 40, pak byl plněn částečně nebo se jednalo o víceleté průběžné aktivity. Celkem deset projektů pak bude plněno až v následujícím období, pět aktivit pak bylo zrušeno. U čtyřech projektů nebylo uvedeno dostatek informací pro posouzení jejich plnění.

Graf 8 Hodnocení plnění aktivit v prioritní ose 6: Cestovní ruch a kultura, veřejná správa, občanská vybavenost a bezpečnost

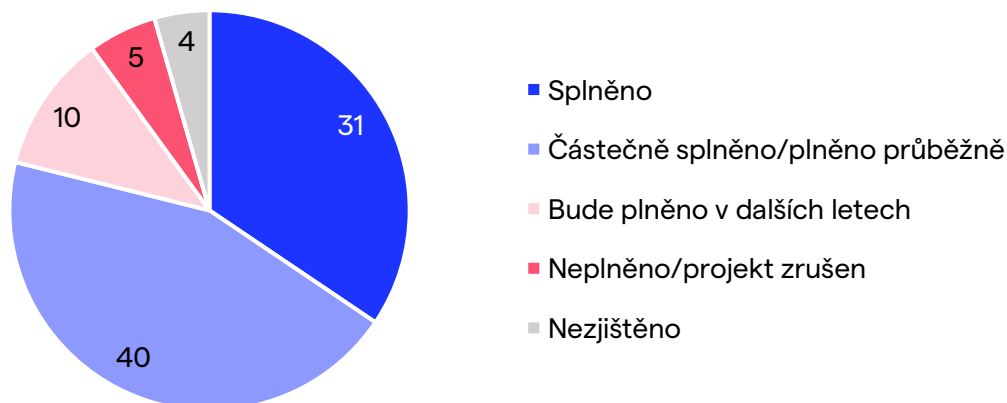

Tabulka 7 Hodnocení plnění aktivit v jednotlivých specifických cílech v prioritní ose 6: Cestovní ruch a kultura, veřejná správa, občanská vybavenost a bezpečnost

Specifický cíl	Splněno	Částečně splněno/ plněno průběžně	Bude plněno v dalších letech	Neplněno nebo projekt zrušen	Nezjištěno
6.1 Využití potenciálu atraktivit cestovního ruchu včetně míst s nižší návštěvností	11	13	0	0	0
6.2 Zajištění dostatečné úrovně infrastruktury pro potřeby cestovního ruchu	5	1	0	0	0
6.3 Podpora památkové péče	0	6	0	0	0
6.4 Podpora živé kultury a udržení kulturního dědictví kraje	3	1	0	0	1
6.5 Moderní veřejná správa	2	5	2	0	0
6.6 Podpora spolupráce mezi zainteresovanými subjekty při rozvoji území (veřejná správa, akademický sektor, společnosti)	4	7	3	2	0
6.7 Zajištění podmínek polycentrického rozvoje území kraje	0	2	0	0	0
6.8 Zajištění občanské vybavenosti a služeb pro obyvatelstvo	5	4	2	0	1
6.9 Zajištění vysokého standardu bezpečnosti obyvatelstva a majetku	1	1	3	3	2
<b>Celkem</b>	<b>31</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>4</b>

## Vyhodnocení financování aktivit v AP SRJMK v roce 2022


Celková profinancovaná částka na aktivity v AP SRJMK činila v roce 2022 celkem **2 806 966 425,0 Kč**, z toho **1 545 686 503,7 Kč** (tj. 55 % z celkových profinancovaných nákladů) šlo z rozpočtu JMK.

Nejvyšší částkou, téměř 1 mld. Kč, byly financovány aktivity v Prioritní ose 3 (Dopravní infrastruktura a obslužnost území), pro rozpočet JMK však byly finančně nejnáročnější aktivity v Prioritní ose 2 (Zdravotnictví a sociální oblast), která se na celkové profinancované částce z rozpočtu JMK podílela 40 %.

Tabulka 8 Financování jednotlivých prioritních os v AP SRJMK v Kč v roce 2022

Prioritní osa	Celkové náklady	z toho z rozpočtu JMK
1. Vzdělávání, sport a mimoškolní zájmové aktivity	332 891 050,0	140 975 442,2
2. Zdravotnictví a sociální oblast	950 111 074,1	615 934 864,2
3. Dopravní infrastruktura a obslužnost území	980 593 333,0	486 884 209,7
4. Životní prostředí, technická infrastruktura, rozvoj venkova a zemědělství	232 273 080,9	154 559 437,9
5. Konkurenceschopnost, podnikání, inovace a výzkum	52 588 801,0	20 793 406,0
6. Cestovní ruch a kultura, veřejná správa, občanská vybavenost a bezpečnost	258 509 086,0	126 539 143,6
<b>Celkem</b>	<b>2 806 966 425,0</b>	<b>1 545 686 503,7</b>

Graf 9: Financování jednotlivých prioritních os v AP SRJMK v Kč v roce 2022 – náklady z rozpočtu JMK

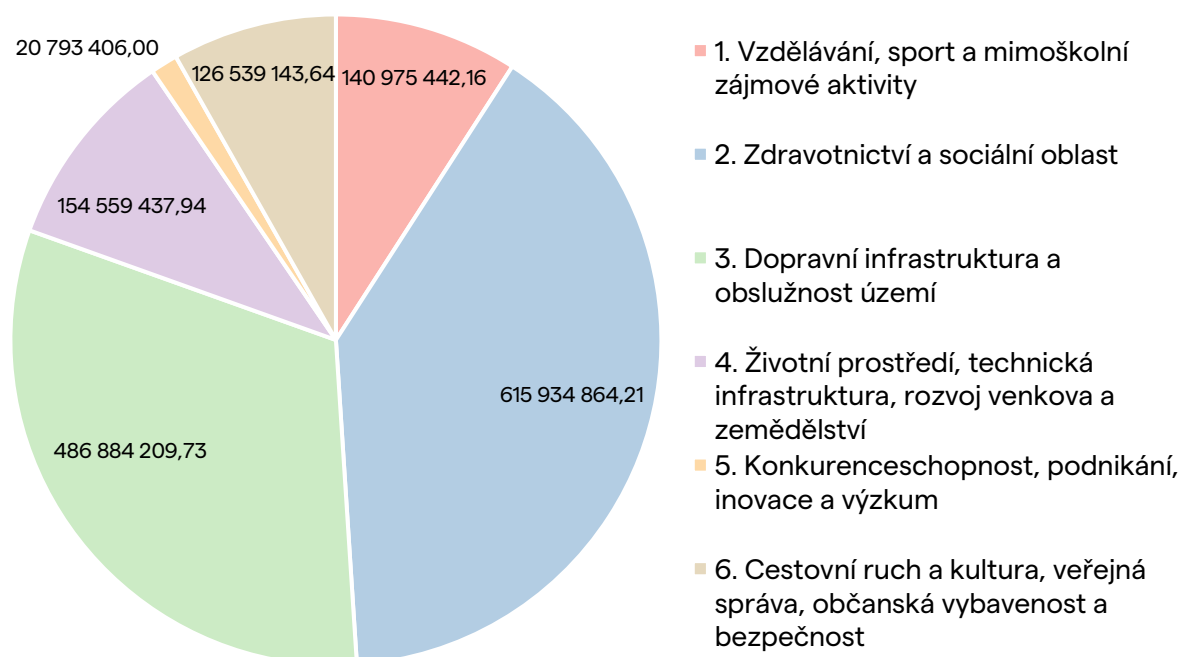

Tabulka 9 Financování aktivit ze specifických cílů v jednotlivých prioritních osách v AP SRJMK za rok 2022

Specifický cíl	Skutečné vynaložené náklady (2022) v tis. Kč	
	Celkové náklady	z toho z rozpočtu JMK
<b>Prioritní osa 1: Vzdělávání, sport a mimoškolní zájmové aktivity</b>	<b>332 891,1</b>	<b>140 975,4</b>
1.1 Podpora maximalizace potenciálu každého obyvatele	165 987,8	19 838,4
1.2 Rozvoj vzdělávání překonávající bariéry a nerovnosti	67 676,9	31 573,3
1.3 Zajištění dostatečných personálních kapacit a rozvoj kvalifikace pedagogického personálu	1 348,9	228,7
1.4 Odpovídající stav vzdělávací infrastruktury	13 315,0	11 343,0
1.5 Zvýšení zájmu o pohyb a sport	52 542,2	52 542,2
1.6 Dostatečná kvalita a kapacita sportovní infrastruktury	22 478,8	20 449,8
1.7 Podpora mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže	9 541,5	5 000,0
<b>Prioritní osa 2: Zdravotnictví a sociální oblast</b>	<b>950 111,1</b>	<b>615 934,9</b>
2.1 Vytvoření systému udržitelného zdravotnictví	629 788,1	484 788,5
2.2 Dostupné sociální služby	235 249,6	86 896,0
2.3 Realizace podmínek pro důstojné stárnutí	1 875,0	1 875,0
2.4 Soudržná společnost bez sociálního vyloučení	83 198,4	42 375,4
<b>Prioritní osa 3: Dopravní infrastruktura a obslužnost území</b>	<b>980 593,3</b>	<b>486 884,2</b>
3.1 Kvalitní dopravní síť kraje	980 593,3	486 884,2
3.2 Zvýšení obslužnosti území a efektivní integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje	0	0
3.3 Snížení uhlíkové stopy dopravního sektoru kraje	0	0
<b>Prioritní osa 4: Životní prostředí, technická infrastruktura, rozvoj venkova a zemědělství</b>	<b>232 273,1</b>	<b>154 559,4</b>
4.1 Zvýšení stability ekosystémů a adaptace území na změnu klimatu	16 735,4	3 586,6
4.2 Zlepšení kvality ovzduší	9 197,8	170,0
4.3 Snižování dopadů lidské činnosti	76 154,3	61 154,3
4.4 Zachování a rozvoj kvality technické infrastruktury	63 315,1	63 315,1
4.5 Rozvoj občanské vybavenosti na venkově	55 599,0	19 499,0
4.6 Zlepšení způsobu obhospodařování půdy	11 271,4	6 834,4

<b>Prioritní osa 5: Konkurenceschopnost, podnikání, inovace a výzkum</b>	<b>52 588,8</b>	<b>20 793,4</b>
5.1 Excelentní výzkum a odborné know-how	26 976,8	7 515,4
5.2 Úspěšné místní firmy a podnikatelé	23 802,0	12 992,0
5.3 Zakořeněné globální společnosti	1 810,0	286,0
<b>Prioritní osa 6: Cestovní ruch a kultura, veřejná správa, občanská vybavenost a bezpečnost</b>	<b>258 509,1</b>	<b>126 539,1</b>
6.1 Využití potenciálu atraktivit cestovního ruchu včetně míst s nižší návštěvností	46 067,3	45 792,6
6.2 Zajištění dostatečné úrovně infrastruktury pro potřeby cestovního ruchu	21 558,5	21 147,1
6.3 Podpora památkové péče	0	0
6.4 Podpora živé kultury a udržení kulturního dědictví kraje	18 359,0	5 770,0
6.5 Moderní veřejná správa	96 875,1	18 971,8
6.6 Podpora spolupráce mezi zainteresovanými subjekty při rozvoji území (veřejná správa, akademický sektor, společnosti)	1 129,1	817,1
6.7 Zajištění podmínek polycentrického rozvoje území kraje	572,1	572,1
6.8 Zajištění občanské vybavenosti a služeb pro obyvatelstvo	59 282,4	18 802,4
6.9 Zajištění vysokého standardu bezpečnosti obyvatelstva a majetku	14 666,0	14 666,0

## Přehled aktivit v jednotlivých prioritních osách s nejvyššími skutečné vynaloženými náklady (v Kč)

Specifický cíl	Tematické opatření	Název aktivity / projektu	Zdroj financování	Skutečné vynaložené náklady	Z toho z rozpočtu JMK	Plnění aktivity	Textový komentář
1.1 Podpora maximalizace potenciálu každého obyvatele	1.1.1 Výuka a rozvoj klíčových kompetencí žáků a studentů	<b>Implementační projekt iKAP JMK II</b>	ESF, SR ČR, JMK	121 179 958	6 062 790	Částečně splněno/plněno průběžně	Uvedené aktivity byly realizovány v rámci projektu Implementace KAP JMK II partnery projektu pro žáky a pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ JMK s celkovou účastí cca 15 000 osob. Některé aktivity jako např. "Otevřené dílny" nebo "Oprav si své auto" byly otevřeny i pro veřejnost, zpravidla rodiče žáků škol.
1.1 Podpora maximalizace potenciálu každého obyvatele	1.1.3 Podpora mezinárodní spolupráce škol a mobility pedagogických pracovníků a studentů	<b>Podpora zájmu učitelů CJ o mezinárodní mobilitu učitelů i žáků škol</b>	Erasmus+, Tandem	21 098 383	0	Částečně splněno/plněno průběžně	Bez textového komentáře.
1.2 Rozvoj vzdělávání překonávající bariéry a nerovnosti	1.2.3 Podpora rovných podmínek ve vzdělávání a podpora začleňování (integrace) cizinců	<b>Podpora dětských domovů, středních škol a škol zřizovaných podle § 16 odst. 9 školského zákona – zřizovatel JMK</b>	JMK	20 000 000	20 000 000	Splněno	Bez textového komentáře.
1.5 Zvýšení zájmu o pohyb a sport	1.5.1 Zajištění široké nabídky sportovních aktivit	<b>Dotační program Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2022–23 – okruh B „Podpora pravidelné činnosti sportovních organizací“</b>	JMK	18 641 000	18 641 000	Splněno	Bez textového komentáře.
1.5 Zvýšení zájmu o pohyb a sport	1.5.3 Podpora talentované mládeže a vrcholového sportu	<b>Dotační program Podpora vrcholového kolektivního sportu v Jihomoravském kraji v roce 2022–23</b>	JMK	17 991 500	17 991 500	Splněno	Bez textového komentáře.

Specifický cíl	Tematické opatření	Název aktivity / projektu	Zdroj financování	Skutečné vynaložené náklady	Z toho z rozpočtu JMK	Plnění aktivity	Textový komentář
2.2 Dostupné sociální služby	2.2.6 Zintenzivnění prevence vzniku rizikových jevů	<b>Dotiční program pro oblast protidrogových aktivit</b>	Rozpočet JMK	140 397 479	9 000 000	Částečně splněno/plněno průběžně	V roce 2022 bylo podpořeno z rozpočtu kraje celkem 26 projektů protidrogové prevence.
2.1 Vytvoření systému udržitelného zdravotnictví	2.1.4 Rozvoj a modernizace technické infrastruktury a vybavenosti zdravotních služeb	<b>Ostrov u Macochy – léčebna se speleoterapií</b>	JMK (Úvěr EIB)	136 832 090	136 832 090	Částečně splněno/plněno průběžně	Průběh akce je zajišťován OINV. Předpokládané celkové náklady akce činí po aktualizaci 220 000 tis. Kč.
2.1 Vytvoření systému udržitelného zdravotnictví	2.1.1 Zajištění dostupnosti a zvyšování kvality zdravotních služeb na území kraje	<b>Výjezdová základna letecké záchranné služby</b>	IROP (RAP JMK), SR ČR, JMK	72 380 000	72 380 000	Bude plněno v dalších letech	Průběh akce je zajišťován OINV. Na akci nebude dotace z IROP (RAP JMK). Předpokládané celkové náklady akce činí po aktualizaci 160 000 tis. Kč.
2.2 Dostupné sociální služby	2.2.3 Zvýšení financování systému sociálních služeb ze strany státu	<b>Humanizace pobytových služeb Sokolnice</b>	MPSV program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016–2022	69 313 000	69 313 000	Splněno	Akce dokončena a zkolaudována v lednu 2023.
2.1 Vytvoření systému udržitelného zdravotnictví	2.1.4 Rozvoj a modernizace technické infrastruktury a vybavenosti zdravotních služeb	<b>Rozvoj a modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – soubor přístrojového vybavení</b>	Fondy EU, SR ČR, JMK	65 328 910	0	Částečně splněno/plněno průběžně	Dotace z REACT-EU byla schválena, ukončení projektu v roce 2023.

Specifický cíl	Tematické opatření	Název aktivity / projektu	Zdroj financování	Skutečné vynaložené náklady	Z toho z rozpočtu JMK	Plnění aktivity	Textový komentář
3.1 Kvalitní dopravní síť kraje	3.1.3 Rekonstrukce regionální silniční infrastruktury a klíčových obecních komunikací	<b>II/385 Čebín obchvat</b>	EFRR+SR+JMK	237 685 262	120 489 333	Částečně splněno/plněno průběžně	Probíhá realizace tělesa komunikace, výstavba mostních objektů.
3.1 Kvalitní dopravní síť kraje	3.1.3 Rekonstrukce regionální silniční infrastruktury a klíčových obecních komunikací	<b>III/37937 Blansko, přemostění</b>	JMK/SFDI	181 452 166	25 815 221	Částečně splněno/plněno průběžně	Stavba je z větší části zrealizována, dokončovací práce v 1. pol. r. 2023. O konkrétním termínu se jedná.
3.1 Kvalitní dopravní síť kraje	3.1.3 Rekonstrukce regionální silniční infrastruktury a klíčových obecních komunikací	<b>II/372 Velké Opatovice – Chlum, extravilány</b>	EFRR+SR+JMK	82 280 000	82 280 000	Bude plněno v dalších letech	Stavební řízení zastaveno.
3.1 Kvalitní dopravní síť kraje	3.1.3 Rekonstrukce regionální silniční infrastruktury a klíčových obecních komunikací	<b>II/429 Bohdalice – Nesovice</b>	EFRR+SR+JMK	66 483 330	27 285 654	Částečně splněno/plněno průběžně	Akce je rozdělena na 4 samostatné stavby. 1. stavba byla dokončena v požadovaných termínech a odpovídající kvalitě. 4. stavba – realizace probíhá, termín dokončení je 30.04.2023. 2. a 3. stavba se připravuje do VŘ – realizace 2023.
3.1 Kvalitní dopravní síť kraje	3.1.3 Rekonstrukce regionální silniční infrastruktury a klíčových obecních komunikací	<b>II/425 Rekonstrukce mostu Brodské 425-031</b>	EFRR+SR+JMK+TTSK	58 080 000	58 080 000	Bude plněno v dalších letech	Probíhá příprava stavby. Realizace 2024+.



Specifický cíl	Tematické opatření	Název aktivity / projektu	Zdroj financování	Skutečné vynaložené náklady	Z toho z rozpočtu JMK	Plnění aktivity	Textový komentář
4.4 Zachování a rozvoj kvality technické infrastruktury	4.4.2 Výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury	<b>Dotační program v oblasti vodního hospodářství</b>	JMK	63 000 600	63 000 600	Částečně splněno/plněno průběžně	Aktivita je průběžná a bude pokračovat i v dalších letech. V roce 2022 byla schválena podpora pro 23 akcí.
4.5 Rozvoj občanské vybavenosti na venkově	4.5.1 Rozvoj infrastruktury pro spolkovou a dobrovolnickou činnost v obcích	<b>Dotační program Podpora rozvoje venkova JMK</b>	JMK	50 000 000	13 900 000	Splněno	Bylo podpořeno 65 akcí na opravu komunikací a chodníků.
4.3 Snižování dopadů lidské činnosti	4.3.1 Podpora snižování energetické náročnosti budov a osvětla v oblasti spotřeby energií	<b>Výměna oken v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno a rekonstrukce světlíků na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno</b>	JMK, Fondy EU – OP ŽP	38 000 000	23 000 000	Částečně splněno/plněno průběžně	Bez textového komentáře.
4.3 Snižování dopadů lidské činnosti	4.3.1 Podpora snižování energetické náročnosti budov a osvětla v oblasti spotřeby energií	<b>Realizace energeticky úsporných opatření</b>	Fondy EU, SR ČR, JMK	37 436 000	37 436 000	Splněno	Akce ukončena a předána do užívání.
4.2 Zlepšení kvality ovzduší	4.2.1 Podpora obnovitelných zdrojů energie	<b>Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji III</b>	Fondy EU	8 423 756	0	Částečně splněno/plněno průběžně	Probíhá vyplácení dotace žadatelům na základě uzavřených smluv

Specifický cíl	Tematické opatření	Název aktivity / projektu	Zdroj financování	Skutečné vynaložené náklady	Z toho z rozpočtu JMK	Plnění aktivity	Textový komentář
5.1 Excelentní výzkum a odborné know-how	5.1.3 Přilákání talentů	<b>Brno Ph.D. Talent</b>	SMB	10 000 000	0	Částečně splněno/plněno průběžně	140 přihlášených PhD studentů, 25 udělených tříletých stipendií-
5.2 Úspěšné místní firmy a podnikatelé	5.2.1 Vhodné podmínky pro vznik a rozvoj podnikání	<b>Inkubační a akcelerační program JIC</b>	JMK, SMB, OP PIK	6 700 000	2 350 000	Splněno	31 podpořených projektů ve fázi inkubace.
5.2 Úspěšné místní firmy a podnikatelé	5.2.1 Vhodné podmínky pro vznik a rozvoj podnikání	<b>JIC Platinn</b>	JMK, SMB, OP PIK	6 190 000	5 400 000	Splněno	88 podpořených projektů.
5.1 Excelentní výzkum a odborné know-how	5.1.2 Popularizace vědy a STEAM	<b>Fabrication Laboratory (FabLab)</b>	JMK, OP PIK	5 500 000	1 900 000	Splněno	526 aktivních členů v roce 2022.
5.2 Úspěšné místní firmy a podnikatelé	5.2.1 Vhodné podmínky pro vznik a rozvoj podnikání	<b>Program Prototypuj a ověřuj</b>	SMB, OP VVV	5 500 000	0	Splněno	4 podpořené projekty v 5. výzvě.

Specifický cíl	Tematické opatření	Název aktivity / projektu	Zdroj financování	Skutečné vynaložené náklady	Z toho z rozpočtu JMK	Plnění aktivity	Textový komentář
6.5 Moderní veřejná správa	6.5.3 Podpora elektronizace úřadu a publikování otevřených dat	<b>Digitální technická mapa Jihomoravského kraje</b>	EFRR	80 610 344	12 453 948	Částečně splněno/plněno průběžně	Díličí činnosti: - pořízení a konsolidace dat pro IS DTM JMK – proběhly 3 etapy po jednotlivých územích (okres Znojmo, Břeclav, Hodonín, Brno-venkov a Brno) - pořízení leteckých snímků, pořízení laserscanu komunikací (MM), - konsolidace dat ZPS, konsolidace TI a DI; - nová měření ZPS, TI a DI, nová měření ZPS-DI. Pořízení IS DTM JMK a jeho implementace - prováděcí dokumentace a zahájení 2. etapy, - vývoj a instalace geodatabází datového skladu a nástrojů pro zavádění dat a jejich průběžnou údržbu, - konfigurace geodatabází a nástrojů v prostředí objednatele, spuštění zavádění dat a průběžné údržby (aktualizace) zavedených dat. Pořízení HW pro DTM JMK - zahájení prováděcí dokumentace.
6.8 Zajištění občanské vybavenosti a služeb pro obyvatelstvo	6.8.5 Podpora spolkového života v obcích	<b>Dotační program Podpora rozvoje venkova JMK</b>	JMK	40 000 000	15 000 000	Splněno	Byla podpořena oprava a obnova kulturních domů, volnočasových center a klubů, které slouží spolkům.
6.8 Zajištění občanské vybavenosti a služeb pro obyvatelstvo	6.8.1 Podpora spolupráce samospráv, svazků obcí a místních akčních skupin v rozvoji území	<b>Dotační program Podpora rozvoje venkova JMK</b>	JMK	19 000 000	3 800 000	Splněno	U MAS podpořen provoz a regionální produkce a používání místní značky, u DT6 pak společné projekty.

Specifický cíl	Tematické opatření	Název aktivity / projektu	Zdroj financování	Skutečné vynaložené náklady	Z toho z rozpočtu JMK	Plnění aktivity	Textový komentář
6.9 Zajištění vysokého standardu bezpečnosti obyvatelstva a majetku	6.9.1 Podpora vybavenosti a zkvalitňování systému Integrovaného záchranného systému (IZS)	<b>Dotační program Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2022</b>	JMK	14 666 000	14 666 000	Částečně splněno/plněno průběžně	Bez textového komentáře.
6.5 Moderní veřejná správa	6.5.1 Podpora procesů a propojení strategického plánování a územního plánování	<b>Dotační program „Dotace obcím na zpracování územních plánů“</b>	JMK	14 528 751	4 781 816	Částečně splněno/plněno průběžně	Bez textového komentáře.

## ZÁVĚR

Hodnocení naplňování AP SRJMK na roky 2022–2023 za rok 2022 je v pořadí prvním hodnocením dokumentu. Hodnocení se týkalo 6 priorit, 32 specifických cílů a 114 tematických opatření a 418 dílčích aktivit v rámci jednotlivých z nich. Informace o finančních nákladech a způsobu plnění byly poskytnuty garanty z odborů KrÚ JMK a zainteresovaných aktérů.

Hodnocení bylo u některých aktivit problematické z důvodu neuvedení dostatku informací o postupu plnění, tudíž část aktivit bylo nutné zhodnotit pouze subjektivně.

Ze zjištěných informací lze usoudit, že nejvýznamnějšími prioritními osami je vzhledem k míře plnění a finančnímu čerpání **Prioritní osa 2: Zdravotnictví a sociální oblast**, ve které byly dvě třetiny aktivit plněny nebo plněny částečně, zvláště kvůli realizaci projektů a dotačních programů ve zdravotnictví a sociálních službách, a také **Prioritní osa 3: Dopravní infrastruktura a obslužnost území**, která sice měla nižší podíl plněných aktivit, ovšem u velké části z aktivit probíhá přípravná fáze realizace a jejich aktivní plnění začne v následujících letech. U **Prioritní osy 1: Vzdělávání, sport a mimoškolní zájmové aktivity** probíhá naplňování aktivit převážně částečně nebo průběžně, důvodem je, stejně jako u Prioritní osy 3, probíhající přípravná fáze u velkého počtu projektů, které budou čerpat finance z IROP, a jejichž realizace začne v roce 2023. Velmi dobré plnění lze vidět i u **Prioritní osy 4: Životní prostředí, technická infrastruktura, rozvoj venkova a zemědělství**, ve které se hodně aktivit realizuje průběžně ve víceletém období. **Prioritní osa 6: Cestovní ruch a kultura, veřejná správa, občanská vybavenost a bezpečnost** má největší počet i podíl aktivit s hodnocením plnění „Splněno“, důvodem je mimo jiné velká rozmanitost a velký dosah dílčích aktivit. Oproti dříve zmíněným má **Prioritní osa 5: Konkurenceschopnost, podnikání, inovace a výzkum** nejvyšší podíl aktivit s hodnocením „Nezjištěno“, příčinou je pozdější vyhodnocení naplňování těchto aktivit jejich gestorem, zájmovým sdružením JIC, které bude řešeno na konci prvního pololetí tohoto roku.

Význam prioritních os a jejich specifických cílů nelze hodnotit čistě na základě celkové profinancované částky, neboť některé aktivity sice nemají vysoké finanční náklady, ovšem jejich dopad může mít velký význam. Tradičně byly v roce 2022 nejvíce nákladné projekty v oblasti dopravní infrastruktury JMK, zvláště pak kvůli stavebním pracím na silniční síti, dále ve zdravotnictví, rovněž z důvodu stavebních prací a také pořizování technického vybavení nemocnic a dalších zdravotnických zařízení, a nakonec i ve vzdělávacích institucích kvůli rekonstrukcím a modernizacím jejich objektů.

Vzhledem k aktuální geopolitické situaci a s tím souvisejícími negativními ekonomickými dopady lze vyhodnotit naplňování AP SRJMK v roce 2022 jako velmi dobré. Z celkového počtu 418 aktivit nebylo plněno pouze u 18 z nich a téměř 90 % ze všech z nich je nebo bude realizována.

Rokem 2023 bude končit platnost AP SRJMK na roky 2022–2023, z toho důvodu začne v průběhu tohoto roku práce na vypracování AP SRJMK na roky 2024–2025. Postup jeho

zpracování bude vycházet z Implementační části SRJMK. Na začátku bude oslovena politická reprezentace JMK za účelem stanovení priorit u všech 32 specifických cílů, následně bude ORR sbírat přehledy projektových záměrů a dílčích aktivit od jednotlivých odborů KrÚ JMK a dalších zainteresovaných subjektů. Z těch bude sestaven AP, v němž budou projektové záměry a aktivity roztrženy pod prioritizované specifické cíle a jejich tematická opatření.

## Seznam zkratek

<b>AP</b>	Akční plán
<b>CCR JM</b>	Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava
<b>DTM JMK</b>	Digitální technická mapa Jihomoravského kraje
<b>EFRR</b>	Evropský fond pro regionální rozvoj
<b>EIB</b>	Evropská investiční banka
<b>ESF</b>	Evropský sociální fond
<b>EU</b>	Evropská unie
<b>HW</b>	Hardware
<b>IROP</b>	Integrovaný regionální operační program
<b>IS DTM</b>	Informační Systém Digitální Technické Mapy
<b>IZS</b>	Integrovaný záchranný systém
<b>JIC</b>	Jihomoravské inovační centrum
<b>JMK</b>	Jihomoravský kraj
<b>KAP JMK</b>	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání
<b>KrÚ JMK</b>	Krajský úřad Jihomoravského kraje
<b>MAS</b>	Místní akční skupina
<b>MPSV</b>	Ministerstvo práce a sociálních věcí
<b>OINV</b>	Odbor investic
<b>OP PIK</b>	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
<b>OP VVV</b>	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
<b>OP ŽP</b>	Operační program Životní prostředí
<b>RAP JMK</b>	Regionální akční plán Jihomoravského kraje
<b>SFDI</b>	Státní fond dopravní infrastruktury
<b>SMB</b>	Statutární město Brno
<b>SRJMK</b>	Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+
<b>SR ČR</b>	Státní rozpočet České republiky
<b>SŠ</b>	Střední škola
<b>TTSK</b>	Trnavský samosprávný kraj
<b>VŘ</b>	Výběrové řízení
<b>ZŠ</b>	Základní škola
